


ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	17 Nov '25							24 Nov '25							01 Dec '25							08 Dec '25							15 Dec '25							22 Dec '25						
						M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
0		Amathounta Minicipality 19.2025 6548 rev.1	28 days	17/11/2025	23/12/2025																																										
1		Preliminaries	23 days	17/11/2025	17/12/2025																																										
2		Βιομηχανική Ζώνη Αγίου Αθανασίου	5 days	18/12/2025	23/12/2025																																										
3		Μιχαήλ Ψέλου	1 day	18/12/2025	18/12/2025																																										
4		Milling	1 day	18/12/2025	18/12/2025																																										
5		Cleaning Surfase&Apply Tack Coat	1 day	18/12/2025	18/12/2025																																										
6		Laying of Asphalt	1 day	18/12/2025	18/12/2025																																										
7		Cleaning&Opening	1 day	18/12/2025	18/12/2025																																										
8		Κουτσοβέντη	2 days	18/12/2025	19/12/2025																																										
9		Milling	1 day	18/12/2025	18/12/2025																																										
10		Cleaning Surfase&Apply Tack Coat	1 day	18/12/2025	18/12/2025																																										
11		Laying of Asphalt	1 day	19/12/2025	19/12/2025																																										
12		Cleaning&Opening	1 day	19/12/2025	19/12/2025																																										
13		Ματθαιου Ματθαιου	2 days	19/12/2025	20/12/2025																																										
14		Milling	1 day	19/12/2025	19/12/2025																																										
15		Cleaning Surfase&Apply Tack Coat	1 day	19/12/2025	19/12/2025																																										
16		Laying of Asphalt	1 day	20/12/2025	20/12/2025																																										
17		Cleaning&Opening	1 day	20/12/2025	20/12/2025																																										
18		Διονος Κ. Ρήγα	2 days	20/12/2025	22/12/2025																																										
19		Milling	1 day	20/12/2025	20/12/2025																																										
20		Cleaning Surfase&Apply Tack Coat	1 day	20/12/2025	20/12/2025																																										
21		Laying of Asphalt	1 day	22/12/2025	22/12/2025																																										
22		Cleaning&Opening	1 day	22/12/2025	22/12/2025																																										
23		Μιχαήλ Ηρακλέους	2 days	22/12/2025	23/12/2025																																										
24		Milling	1 day	22/12/2025	22/12/2025																																										
25		Cleaning Surfase&Apply Tack Coat	1 day	22/12/2025	22/12/2025																																										
26		Laying of Asphalt	1 day	23/12/2025	23/12/2025																																										
27		Cleaning&Opening	1 day	23/12/2025	23/12/2025																																										
28		Ιαπετού	1 day	23/12/2025	23/12/2025																																										
29		Milling	1 day	23/12/2025	23/12/2025																																										
30		Cleaning Surfase&Apply Tack Coat	1 day	23/12/2025	23/12/2025																																										
31		Laying of Asphalt	1 day	23/12/2025	23/12/2025																																										
32		Cleaning&Opening	1 day	23/12/2025	23/12/2025																																										

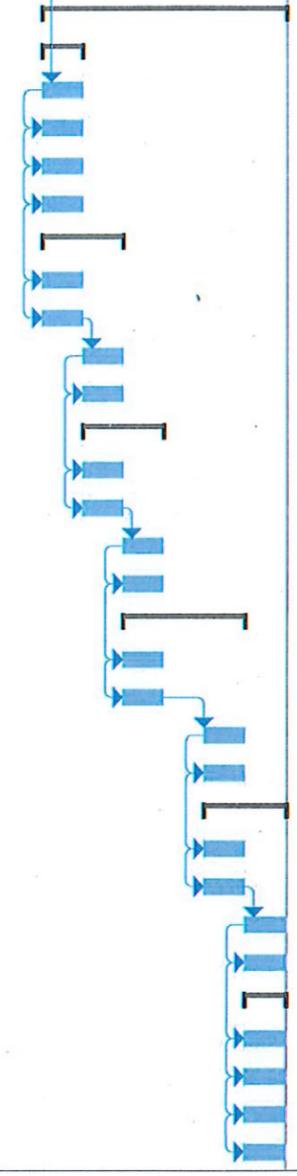

Project: Amathounta Minicipal Date: 09/12/2025	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΤΖΙΔΑΝΝΟΥ

8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 555μ2 2023

ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΒΟΥ

Α1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

ΦΑΛΕΑ

ΦΑΛΕΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΒΕΝΤΗ

ΜΑΤΣΑΙΟΥ ΜΑΤΣΑΙΟΥ

ΡΟΔΙΩΝΟΣ ΡΗΓΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΙΑΠΕΤΟΥ

ΙΑΠΕΤΟΥ

ΙΑΠΕΤΟΥ

Γ

Β

Υ

